DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK

WEBSITE PROFIL DAN KATALOG

MOOOLAGI CREATIVE STUDIO

Dokumen 01 Bagian II – Fase Perencanaan Proyek

Nama Klien	Nalla Herbaria (Mooolagi Creative Studio)
Kelompok / Kelas	2 / 4KA21
Project Manager	Muhammad Alatas, 10123741
Dosen Pengampu	Dr. LULU CHAERANI MUNGGARAN, S.Kom., M.M.S.I.
Tanggal / Versi	25-10-2026 / Versi 1.0

1. PENDAHULUAN

1.1 Ringkasan Requirement Document (Bagian I)


Masalah utama klien	Sistem pemesanan produk masih bersifat manual melalui pengisian *Google Form*, sehingga kurang efisien, rentan kesalahan pencatatan, dan tidak terintegrasi langsung dengan manajemen data yang terpusat.
Solusi terpilih	Membangun/mengembangkan sistem berbasis web (*website custom*) yang berfungsi sebagai etalase *Company Profile*, Katalog Produk, dan portal pemesanan dengan fitur pengecekan pembayaran unggah bukti manual yang terpusat.
Metodologi	*System Development Life Cycle (SDLC)* dengan pendekatan *Waterfall* yang tahapannya sekuensial dan terstruktur.
Perubahan sejak Bagian I	Tidak ada perubahan ruang lingkup.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk menggambarkan alur proses bisnis dari sistem usulan, rancangan desain sistem secara garis besar, analisis kelayakan solusi teknis dan ekonomi, serta rincian pekerjaan (WBS) dan jadwal (*Gantt Chart*) proyek.

2. GAMBARAN PROSES BISNIS


2.1 Proses Bisnis Saat Ini (As-Is)

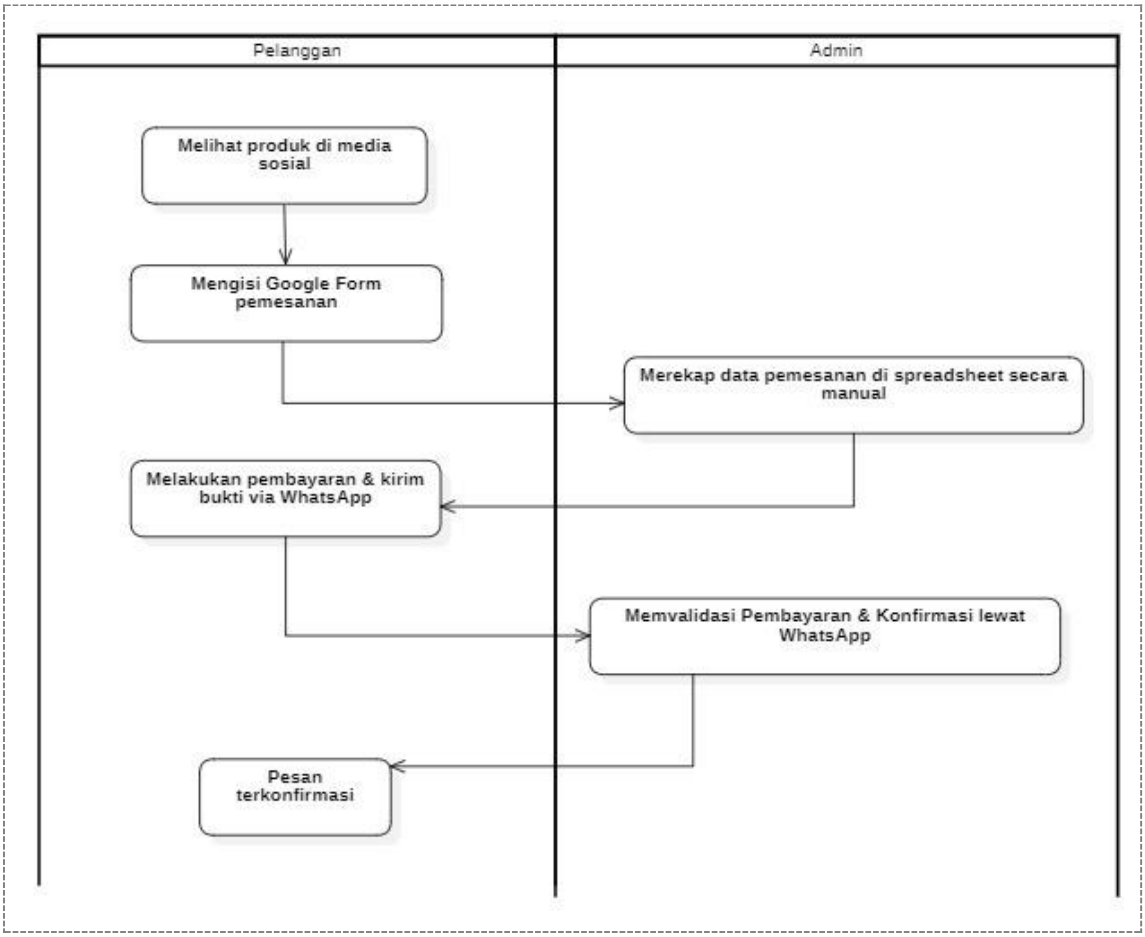

Gambar 2.1 Proses Bisnis Saat Ini

Saat ini, pelanggan melihat produk dari media sosial, lalu mengisi *Google Form* untuk pesanan. Admin merekap data secara manual, memvalidasi pembayaran dari tangkapan layar WhatsApp, dan mengonfirmasi pesanan secara manual yang memakan waktu dan berisiko tercecer.

2.2 Proses Bisnis Usulan (To-Be)

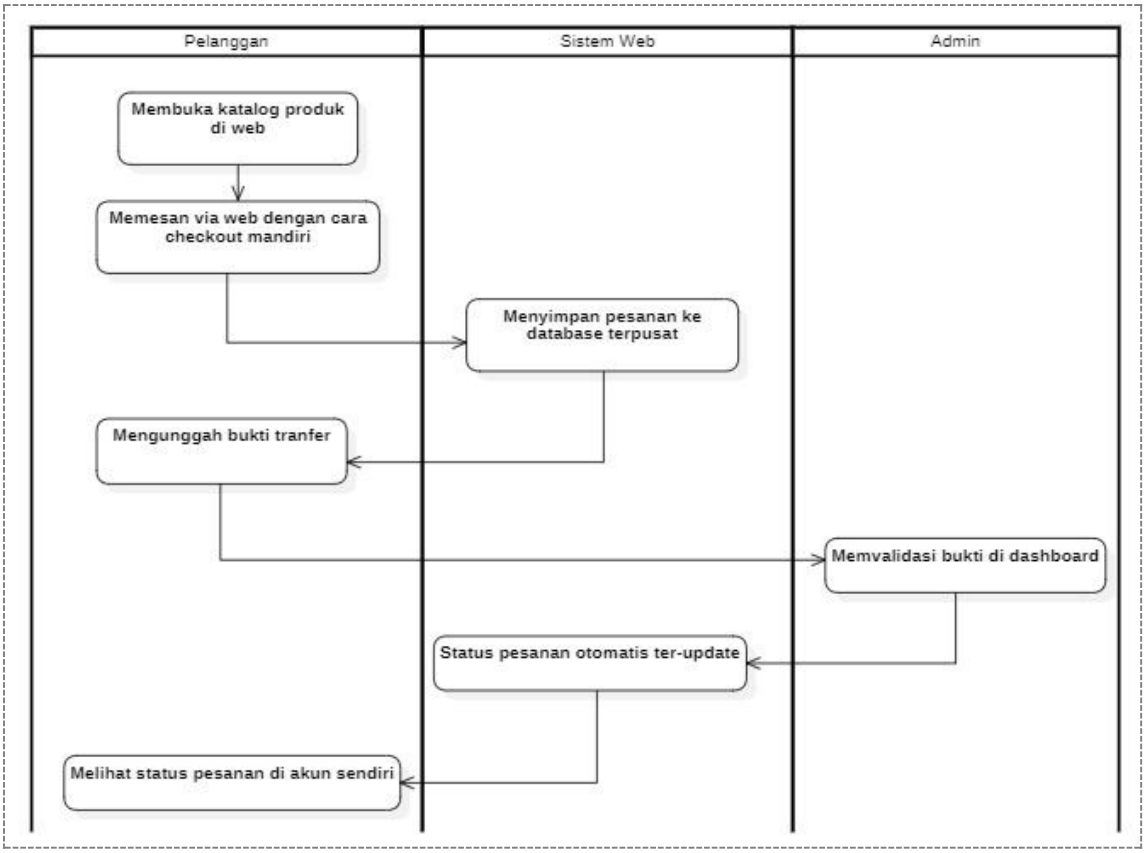


Gambar 2.2 Proses Bisnis Usulan

Langkah / Aktivitas	Saat Ini (As-Is)	Usulan (To-Be)	Perbaikan
Melihat Katalog	Pelanggan menelusuri di media sosial secara terpisah	Terintegrasi langsung di menu Katalog web	Terstruktur & informatif
Pengajuan Pesanan	Melalui *Google Form*	Checkout mandiri lewat web	Database terpusat otomatis
Validasi Bukti Transfer	Pelanggan *chat* WhatsApp ke Admin	Pelanggan unggah foto ke *Dashboard Payment* pesanan	Status ter-update *real-time*

3. GAMBARAN DESAIN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Sistem

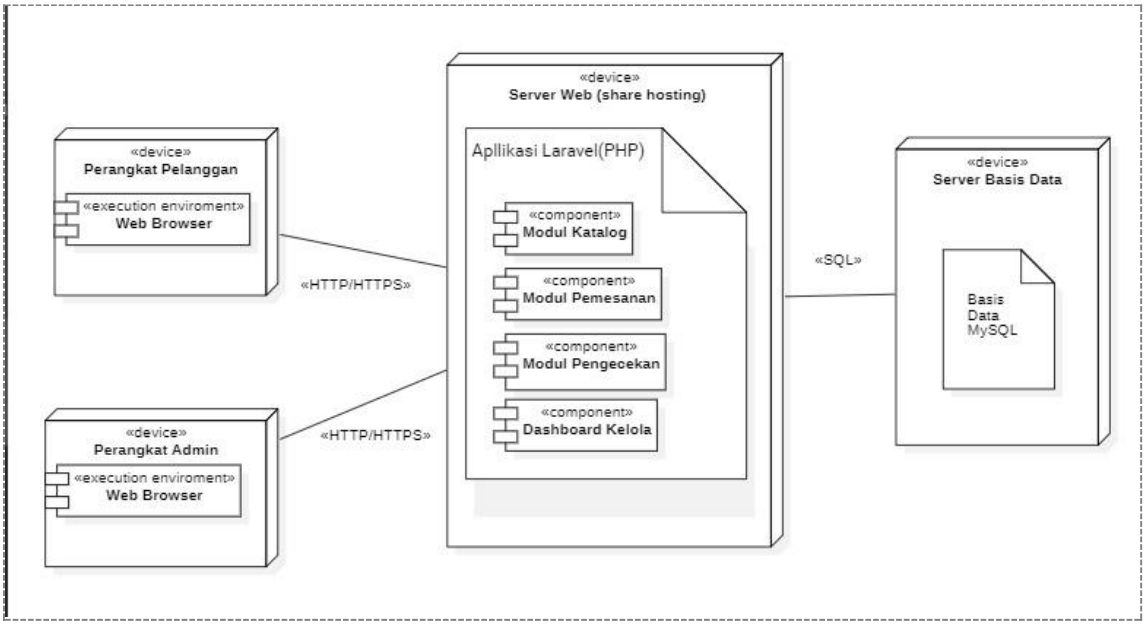

Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem

3.2 Modul / Komponen Utama

Modul	Fungsi	Pengguna	Fungsi RD (Bagian I)	Terhubung dengan
Modul *Company Profile*	Menampilkan informasi profil bisnis, portofolio, testimoni, dan kontak web	Pengunjung / Pelanggan	F-01	Modul Katalog
Modul Katalog	Menampilkan detail harga dan produk	Pelanggan	F-02	Modul Pemesanan
Modul Pemesanan	Formulir pembuatan pesanan & keranjang	Pelanggan	F-03	Modul Pengecekan
Modul Pengecekan	Cek status & form unggah bukti transfer	Pelanggan	F-04	Dashboard Admin
Dashboard Kelola	Tambah/Edit portofolio, produk, validasi pesanan	Admin	F-05, F-06	Modul Katalog & Pengecekan

3.3 Rencana Arsitektur dan Teknologi

Komponen	Rencana	Alasan Pemilihan
Platform / jenis aplikasi	*Website Responsif (Mobile-Friendly)*	Akses bisa untuk dekstop maupun mobile
Bahasa & framework	PHP (*Framework Laravel*)	Sangat kustomisasi, ringan, aman.

Komponen	Rencana	Alasan Pemilihan
Basis data (DBMS)	*MySQL*	Andal untuk pengelolaan data relasional di web.
Server uji & produksi	*Shared Hosting*	Biaya relatif terjangkau dengan kebutuhan spesifikasi bisnis.
Alat bantu tim	*GitHub, Excel, Whatsapp, AI*	Menyimpan repository, membuat chart, komunikasi tim, dan pengkoreksi proyek

4. ANALISIS KELAYAKAN

4.1 Kelayakan Teknis

Aspek	Kebutuhan Solusi	Kondisi Saat Ini	Kesimpulan
Perangkat keras	PC/Laptop dan *Smartphone* Admin	Klien memiliki *smartphone* dan PC kasir operasional	Layak
Perangkat lunak	*Browser* internet standar (Chrome/Safari)	Tersedia di gawai klien	Layak
Jaringan / internet	Koneksi internet yang stabil untuk mengakses *website* klien dan *dashboard* admin	Klien dan target pelanggan mayoritas sudah memiliki akses jaringan seluler (4G/5G) atau Wi-Fi yang memadai	Layak
Kemampuan tim	Membangun web *custom* Laravel & MySQL	Programmer familiar dengan kerangka kerja Laravel	Layak
Kemampuan pengguna	Kemampuan dasar mengoperasikan *browser* web dan adaptasi admin dalam mengelola *dashboard*	Admin klien sudah sangat terbiasa mengelola *Google Form* dan media sosial, sehingga adaptasi ke *dashboard* web akan sangat mudah	Layak

4.2 Kelayakan Ekonomi

Komponen Biaya	Jenis	Jumlah (Rp)	Ditanggung oleh
Domain & hosting basic	Operasional / tahun	300.000	Klien (saat *deploy* resmi)
Pengembangan Web (Estimasi)	Jasa mahasiswa / sekali	0	Tim IT (Proyek Kuliah)
Total		**300.000**	

Manfaat	Berwujud / Tidak Berwujud	Perkiraan Nilai per Tahun
Menghemat waktu rekap order manual	Berwujud	(Tergantung UMR)
Akurasi data pesanan terpusat	Berwujud	Meminimalisir kerugian
Citra *brand creative* lebih profesional	Tidak berwujud	-

Analisis: Secara ekonomi sangat layak dilanjutkan karena beban investasi teknologi (*hosting*) sebesar Rp 300.000/tahun sangat kecil dibanding rasio keselamatan data pesanan dan memangkas waktu kerja admin secara signifikan.

4.3 Kelayakan Operasional

Aspek	Penilaian	Kesimpulan
Dukungan pemilik/manajemen	*Owner* Mooolagi sangat kooperatif dan bertindak sbg klien	Sangat Mendukung
Kesiapan & penerimaan pengguna	Admin sudah terbiasa beroperasi menggunakan *platform* digital (*Google Form* & media sosial), sehingga transisi ke *dashboard* web akan sangat mudah diterima.	Siap dan Layak
Kesesuaian dengan proses kerja (Bagian 2)	Alur memindahkan sistem manual g-form menjadi dasbor web terpusat	Layak dan Efisien
Kemampuan klien memelihara sistem	Klien mampu mengelola pembaruan konten secara mandiri melalui *dashboard*, namun membutuhkan *User Manual* sebagai panduan operasional teknisnya.	Layak dengan Panduan

4.4 Risiko Terkait Kelayakan

ID	Risiko	Aspek	Peluang	Dampak	Mitigasi
R-04	Klien belum membelikan hosting saat fase penerapan	Ekonomi	Rendah	Tinggi	Gunakan *free/student hosting server* sementara untuk UAT.


4.5 Kesimpulan Kelayakan

Aspek	Hasil	Catatan
Teknis	Layak	Ketersediaan perangkat keras/lunak, stabilitas jaringan, serta keahlian tim Programmer sudah memadai untuk pengembangan sistem custom Laravel.

Aspek	Hasil	Catatan
Ekonomi	Layak	Beban investasi tahunan (hosting) tergolong sangat kecil dibandingkan dengan manfaat efisiensi waktu kerja dan keakuratan pencatatan data pesanan.
Operasional	Layak bersyarat	Owner sangat mendukung dan admin siap beradaptasi, dengan syarat harus disediakan dokumen pendukung berupa User Manual atau panduan operasional dashboard sebelum serah terima.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

5.1 Diagram WBS

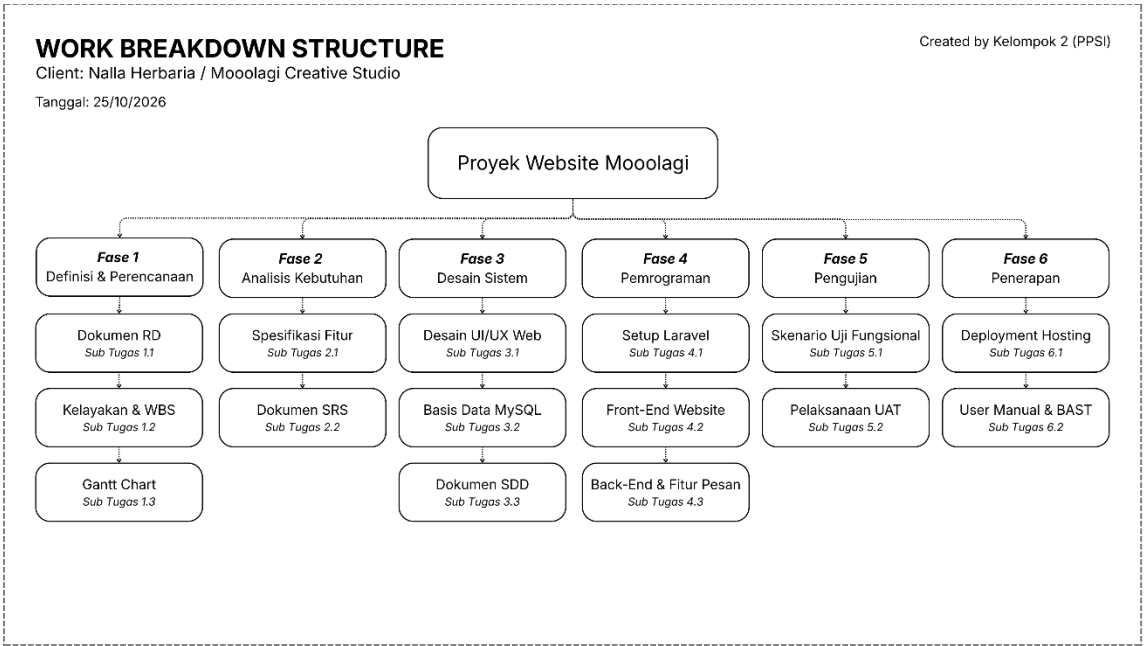

Gambar 5.1 Work Breakdown Structure

5.2 Kamus WBS

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
1	**Definisi & Perencanaan**	Requirement Document, Gantt	SA, PM	~14
1.1	Dokumen RD	Dok. 01 Bag I	SA	7
1.2	Kelayakan & WBS	Struktur WBS	PM	4
1.3	Gantt Chart	Jadwal Proyek	PM	3

Kode	Paket Kerja	Deliverable	PIC (Peran)	Durasi (hari)
2	**Analisis Kebutuhan**	SRS	SA	~14
2.1	Spesifikasi Fitur	List Fitur	SA	7
2.2	Dokumen SRS	Dok. SRS Final	SA	7
3	**Desain Sistem**	SDD, UI/UX	SD	~14
3.1	Desain UI/UX Web	*Wireframe/Mockup*	SD	5
3.2	Basis Data MySQL	ERD & *Schema*	SD	4
3.3	Dokumen SDD	Dok. SDD Final	SD	5
4	**Pemrograman**	Aplikasi (Web)	Programmer	~28
4.1	Setup Laravel	Repositori Projek	Programmer	5
4.2	Front-End Website	Tampilan Statis Web	Programmer	10
4.3	Back-End & Fitur Pesan	Fungsional Database	Programmer	13
5	**Pengujian**	Skenario UAT	Tester	~7
5.1	Skenario Uji Fungsional	*Test Case*	Tester	3
5.2	Pelaksanaan UAT	Hasil Pengujian	Tester	4
6	**Penerapan**	Hosting, BAST	Tim	~14
6.1	Deployment Hosting	Web *Online*	Programmer	7
6.2	User Manual & BAST	Buku Panduan	Tech Writer	7

6. JADWAL PROYEK (GANTT CHART)

6.1 Jadwal dan Ketergantungan Tugas


Kode WBS	Tugas	Mulai	Selesai	Durasi	Pendahulu
1	**Definisi & Perencanaan**	28 September 2026	18 Oktober 2026	3 minggu	–
2	**Analisis Kebutuhan**	19 Oktober 2026	25 Oktober 2026	1 minggu	1
3	**Desain Sistem**	26 Oktober 2026	15 November 2026	3 minggu	2
4	**Pemrograman**	16 November 2026	20 Desember 2026	5 minggu	3
5	**Pengujian**	21 Desember 2026	27 Desember 2026	1 minggu	4

Kode WBS	Tugas	Mulai	Selesai	Durasi	Pendahulu
6	**Penerapan**	28 Desember 2026	10 Januari 2027	2 minggu	5

6.2 Milestone

Kode	Milestone	Minggu	Bukti Tercapai
M1	Requirement Document disetujui klien	3	Lembar persetujuan klien
M2	Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai	4	Dokumen 01 Bagian II
M3	Dokumen SRS selesai	4	Dokumen SRS
M4	Dokumen SDD selesai	7	Dokumen SDD
M5	Aplikasi Kode Pemrograman Selesai	12	Source Code & Database
M6	Skenario Uji & UAT diterima klien	13	Hasil/Skenario Pengujian
M7	Deployment Hosting, Pelatihan & BAST	15	BAST bertanda tangan

6.3 Gantt Chart

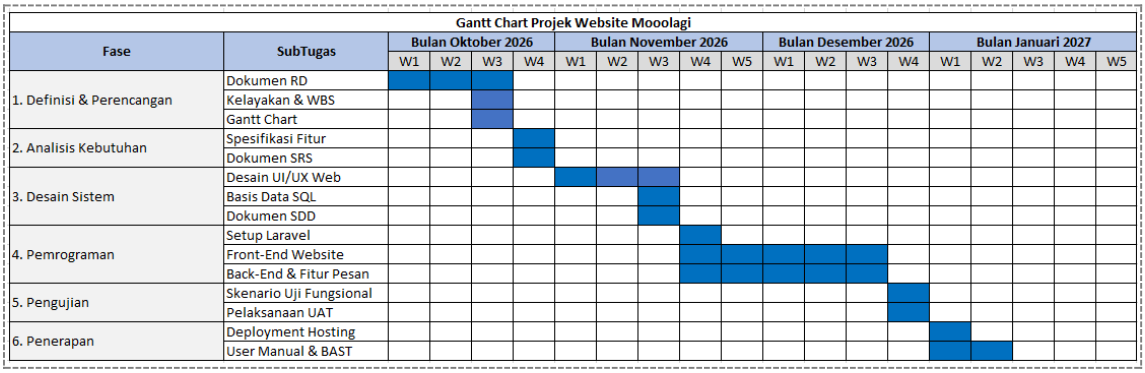

Gambar 6.1 Gantt Chart Proyek

7. RENCANA PEMANTAUAN PROYEK

Pemantauan jadwal proyek akan dikelola oleh *Project Manager* (PM) menggunakan pelacakan di Microsoft Excel. Rapat internal tim akan diadakan mingguan via pertemuan daring/luring singkat, dan progres realisasi Gantt Chart akan di-update (dengan status Selesai, Terlambat, Revisi, atau Belum). Apabila terjadi *blocker* (seperti revisi *Mockup* UI dari klien yang melebihi 1 minggu), PM akan menindaklanjuti secara langsung kepada *Founder* Mooolagi.

8. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

1. Schwalbe, K. (2019). *Information Technology Project Management*. 9th Edition.
2. Project Management Institute. (2021). *PMBOK Guide*. 7th Edition.
3. *Requirement Document Proyek Mooolagi Creative Studio*. Universitas Gunadarma.

4. **Pernyataan Penggunaan AI:** Sebagian struktur tabel dokumen perencanaan ini disusun menggunakan bantuan AI untuk mengonversi gambar WBS dan diagram *Gantt Chart* ke dalam bentuk penjabaran tekstual, serta menata bahasa format matriks kelayakan ekonomi/teknis yang kemudian diverifikasi kembali oleh tim.
